Управление проектом сайта «ИТ Гильдия» в YouTrack

Оглавление

1 Проект и ресурсный план 2
1.1 Команда и учётные записи 2
1.2 Ресурсный план 2
2 Конфигурация проекта 3
2.1 Scrum-доска и workflow 3
2.2 План работ 5
2.3 Релиз 7
3 Интеграции 8
3.1 GitHub 8
3.2 Электронная почта 10
4 Симуляция выполнения 11
5 Метрики YouTrack 12
5.1 Time Report 12
5.2 Burndown 13
5.3 Gantt Chart 14
5.4 Ограничение комплекта отчётов 15
6 Вывод 15

1 Проект и ресурсный план

Проект IT Guild Website (ITG) создан в YouTrack Cloud. Основа планирования — требования и декомпозиция работ первой лабораторной: корпоративный сайт на WordPress, 18 работ, 118 чел.-ч. Деятельность моделируется в учебных целях, фактическая реализация сайта в данной работе не подтверждается.

1.1 Команда и учётные записи

Один участник — Молчанов Ф. Д. (учётная запись admin). Совмещены функции руководителя проекта, разработчика WordPress и тестировщика. В проекте зарегистрирован один исполнитель с правами System Admin, Contributor, Project Admin. Дополнительные вымышленные учётные записи не создавались.

1.2 Ресурсный план

Этап	Интервал	Задачи	План, ч
Sprint 1	09–15.10.2026	ITG-1—5	42
Sprint 2	16–22.10.2026	ITG-6—11	37
Sprint 3	23–29.10.2026	ITG-12—18	39
Итого	3 спринта	18	118

Для одного исполнителя принято 8 часов за рабочий день. 118 чел.-ч соответствуют 14,75 человеко-дня. Интервалы спринтов календарные, не пересекаются; фактическая загрузка в пределах отдельных дат моделируется записями времени.

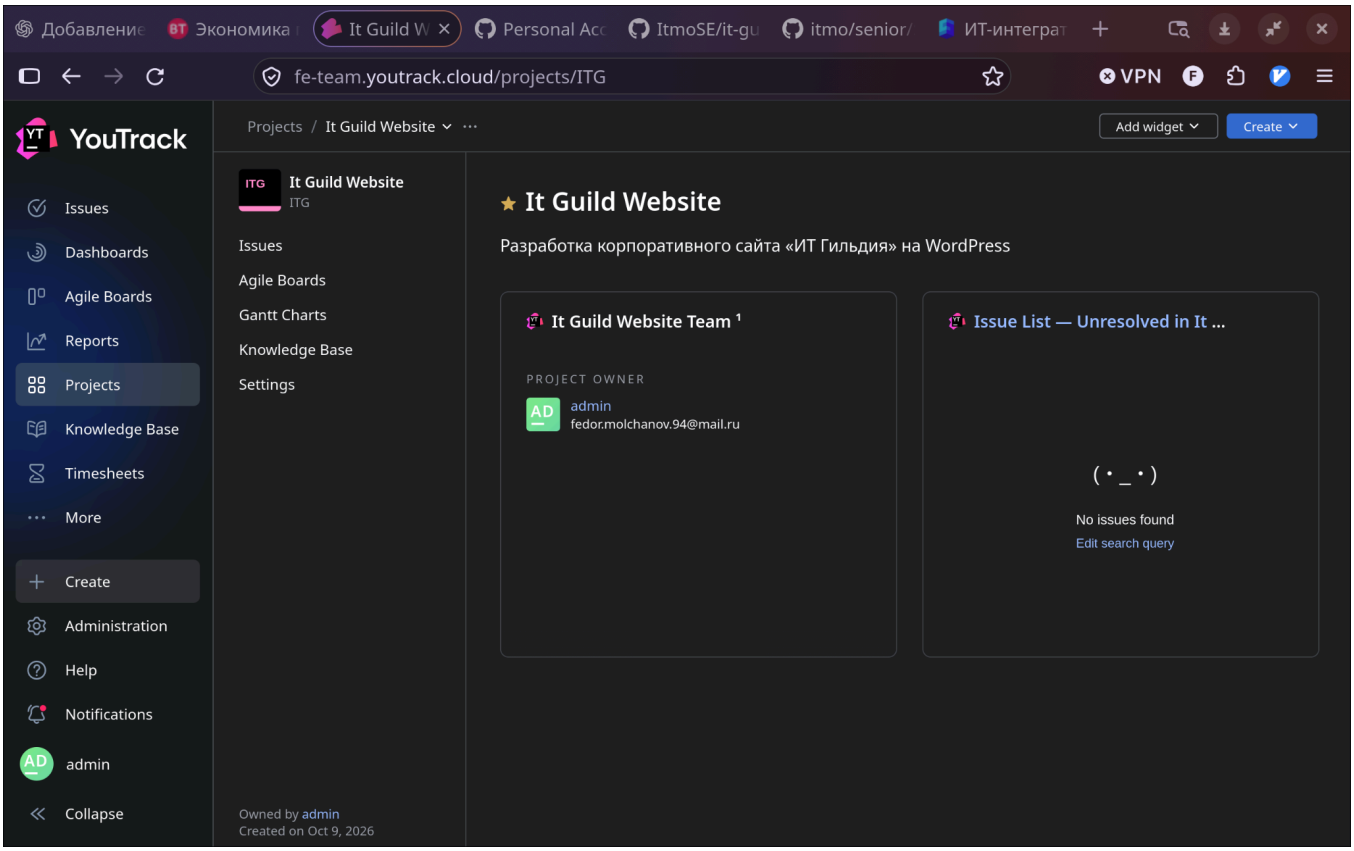


Рис. 1. Проект IT Guild Website (ITG).

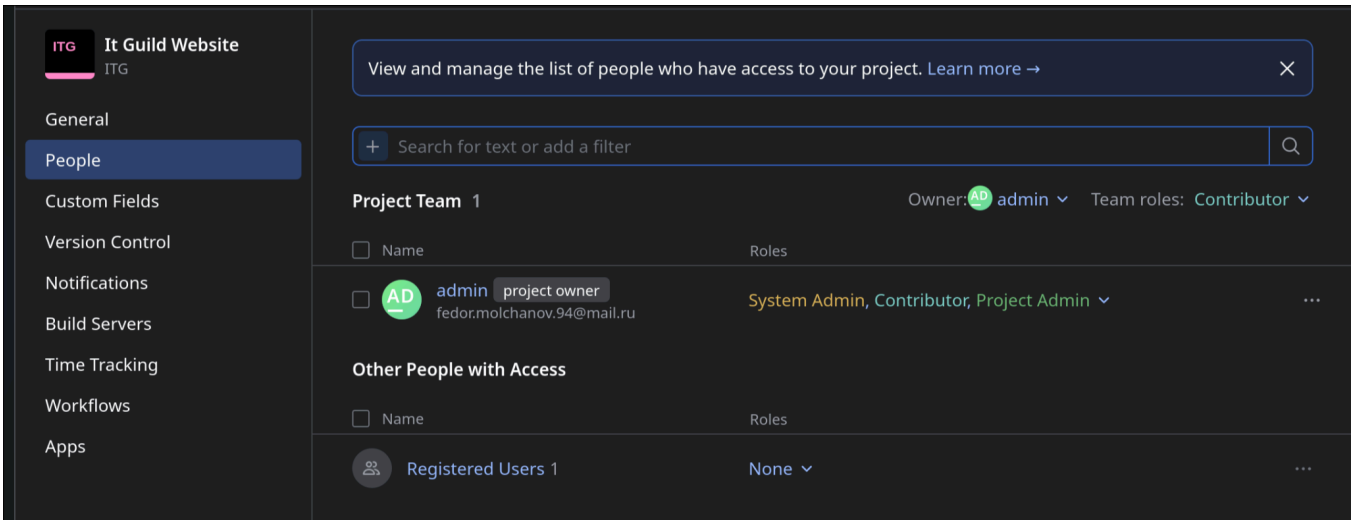


Рис. 2. Единственный участник и назначенные права.

2 Конфигурация проекта

2.1 Scrum-доска и workflow

Создана доска IT Guild Scrum. Поле State определяет четыре столбца: Open, In Progress, Review, Done. Состояние Done классифицировано как resolved. Применён Scrum с тремя спринтами.

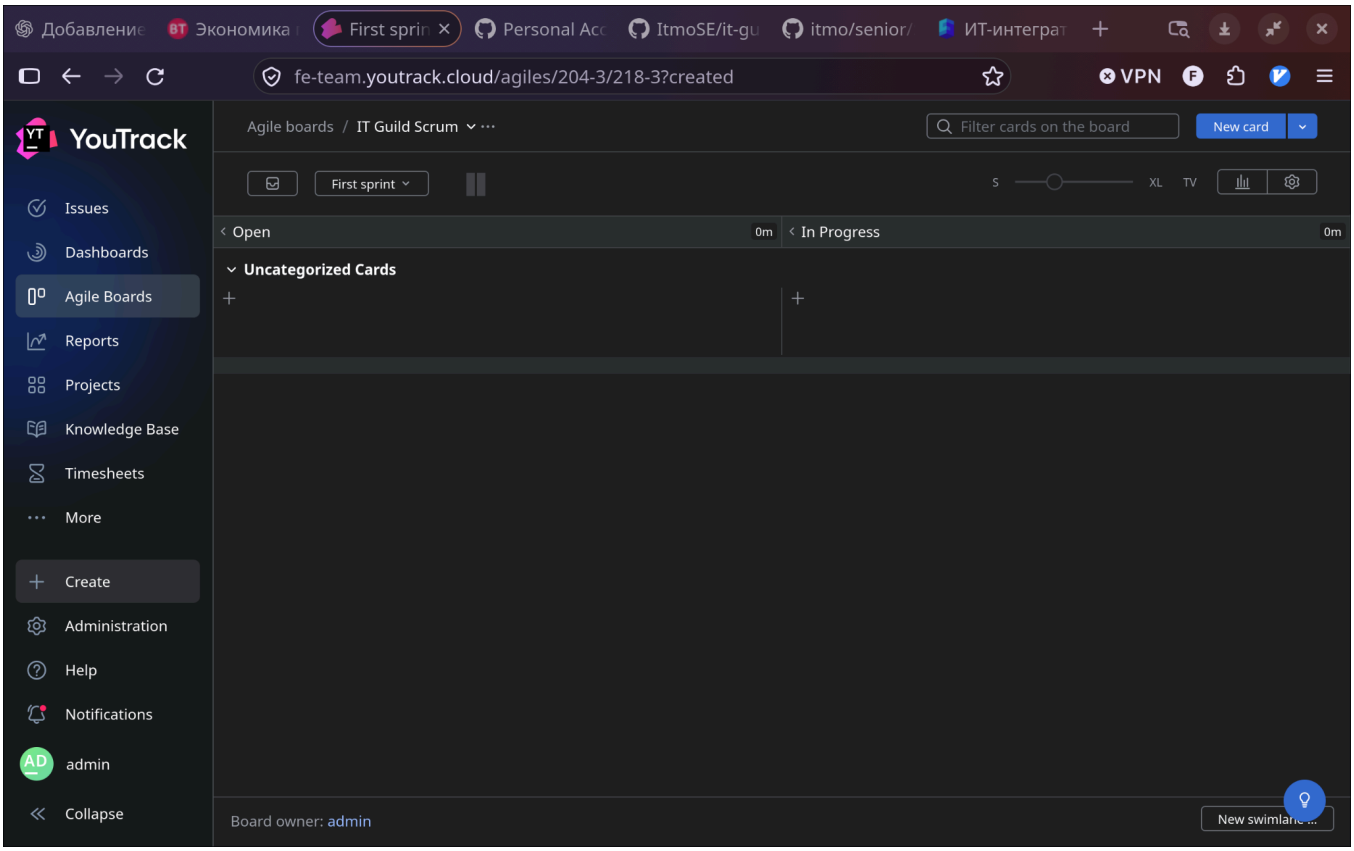


Рис. 3. Создана Scrum-доска.

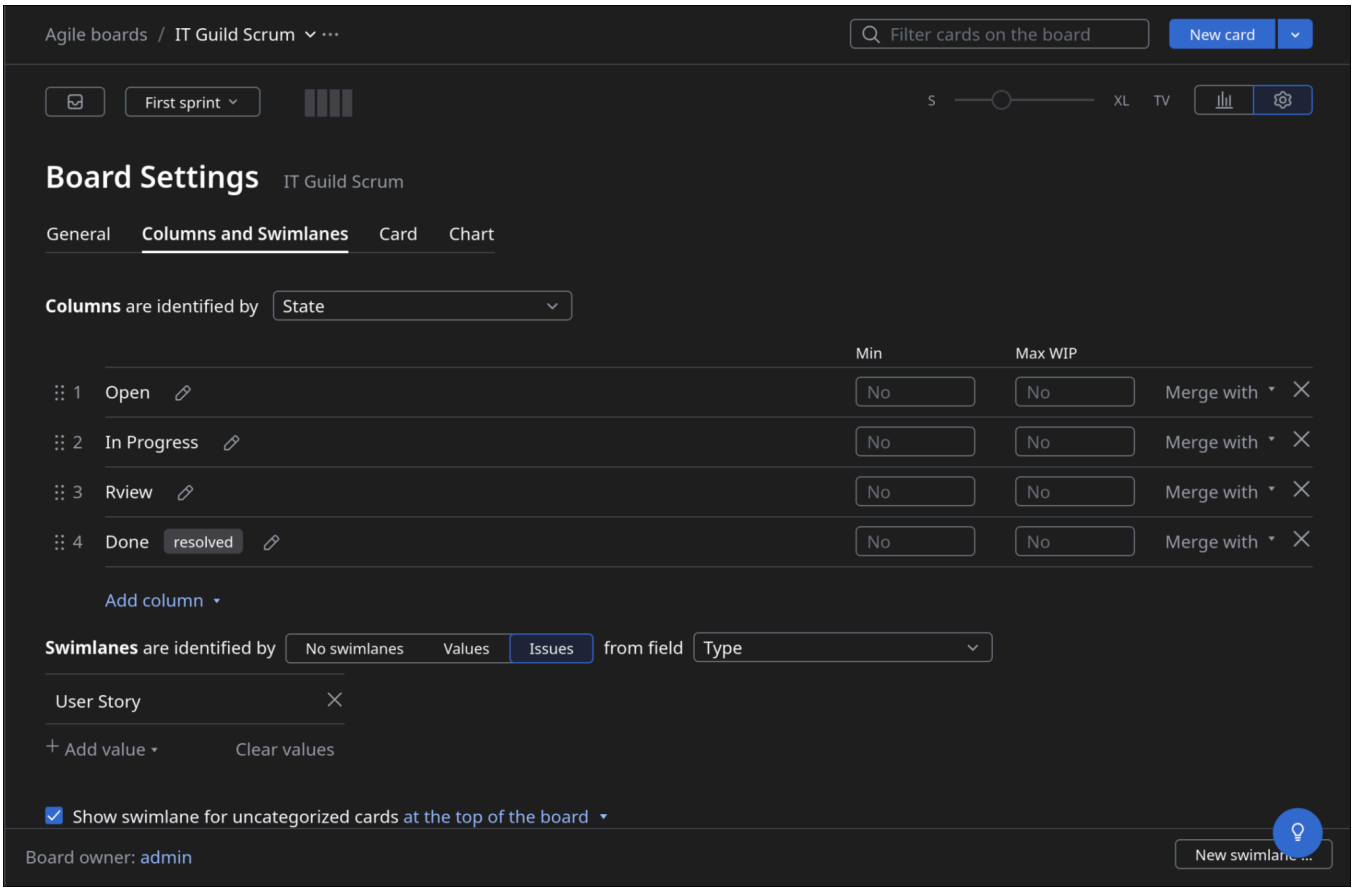


Рис. 4. Настройка состояний Scrum-доски.

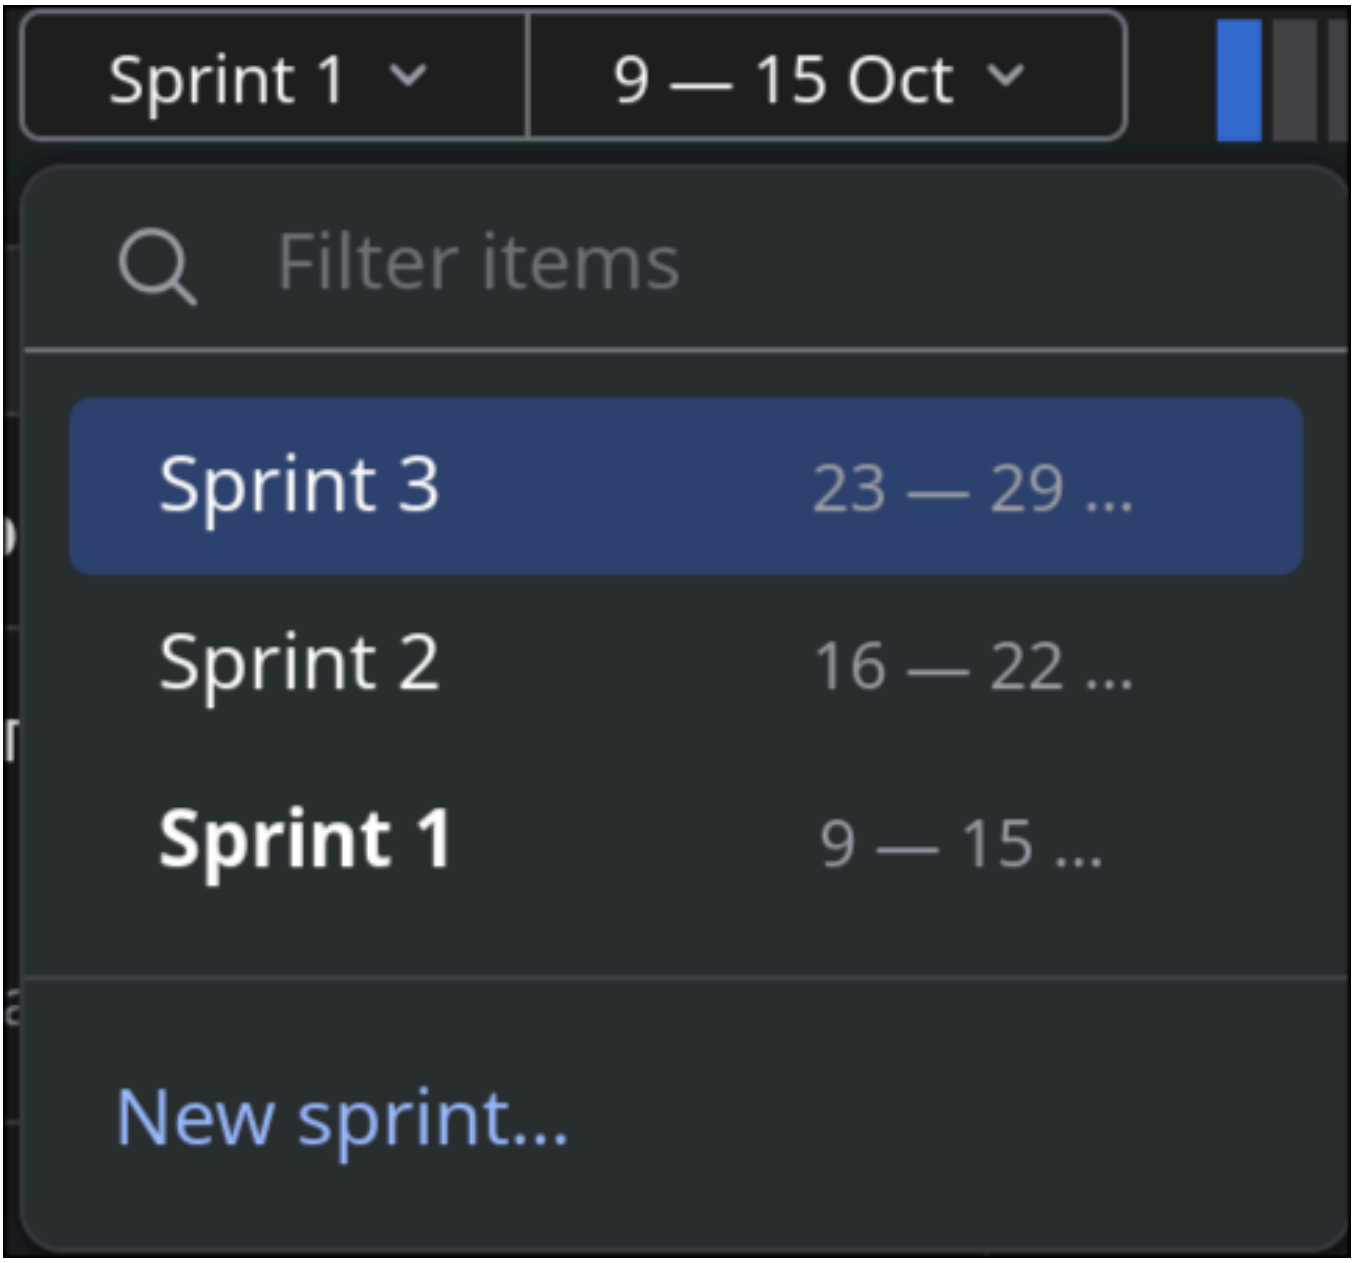


Рис. 5. Спринты и непересекающиеся интервалы.

2.2 План работ

Созданы 18 задач ITG-1—ITG-18 с оценками, соответствующими первой лабораторной. Каждая задача имеет исполнителя admin, тип Task и плановую оценку Estimation.

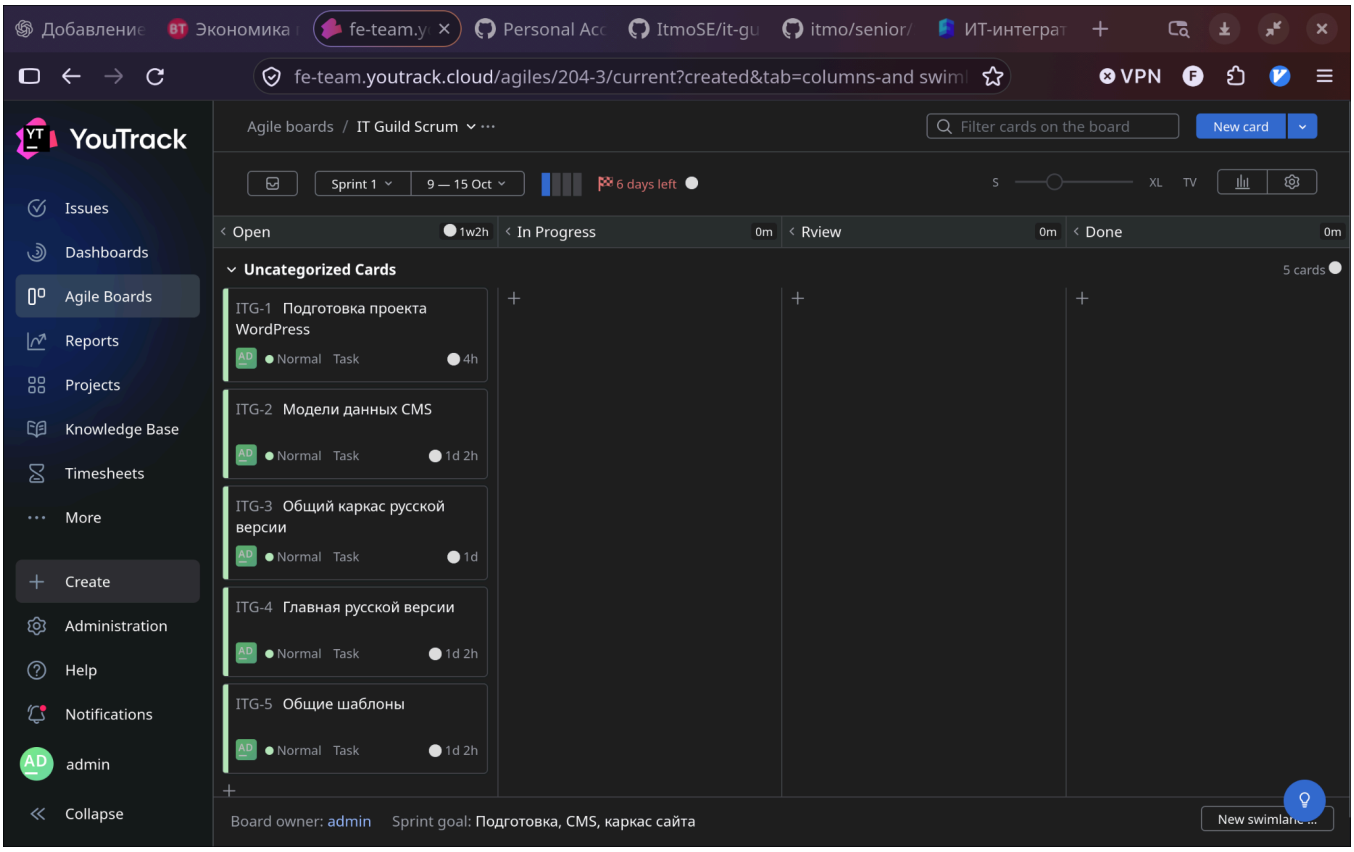


Рис. 6. Sprint 1: пять задач, оценка 42 ч.

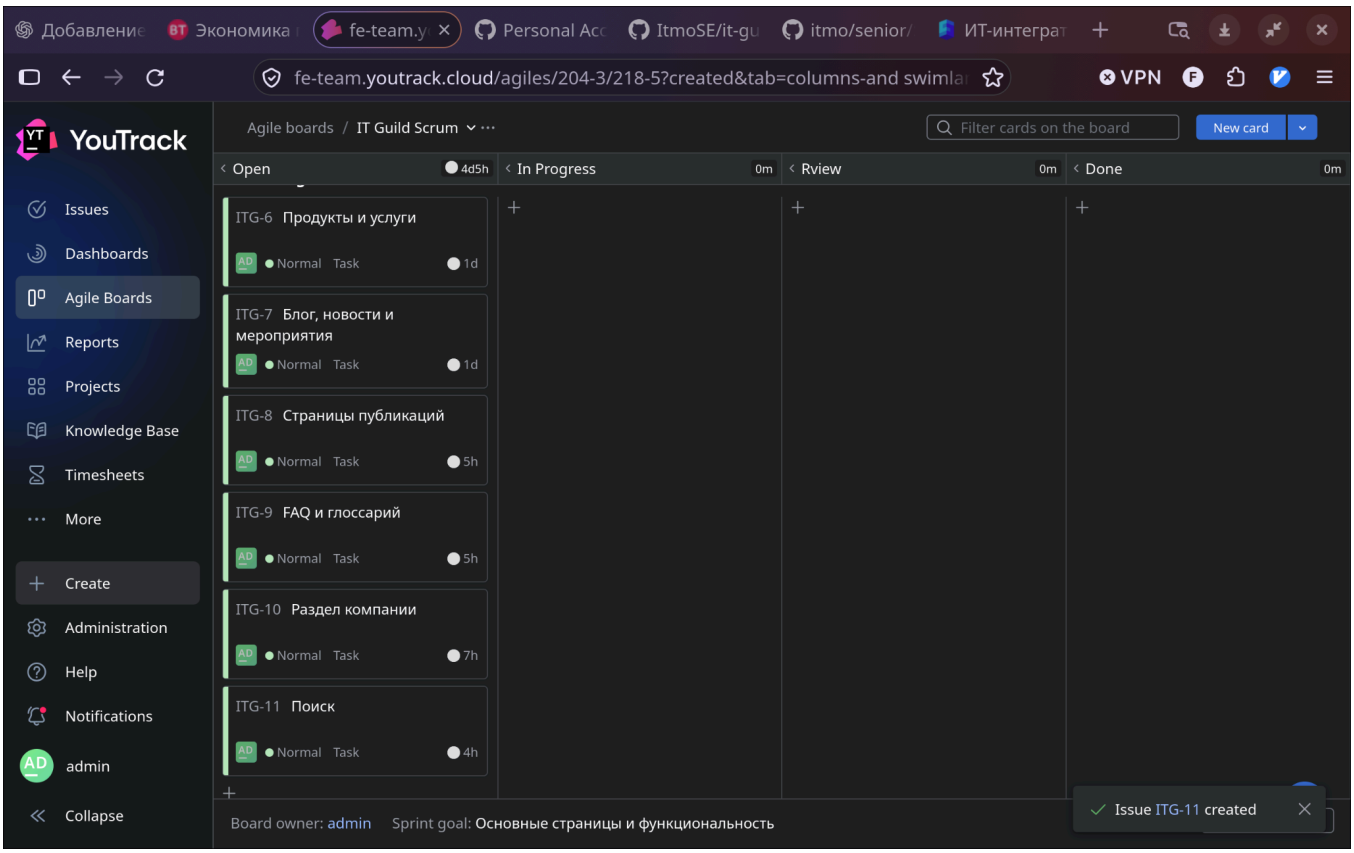


Рис. 7. Sprint 2: шесть задач, оценка 37 ч.

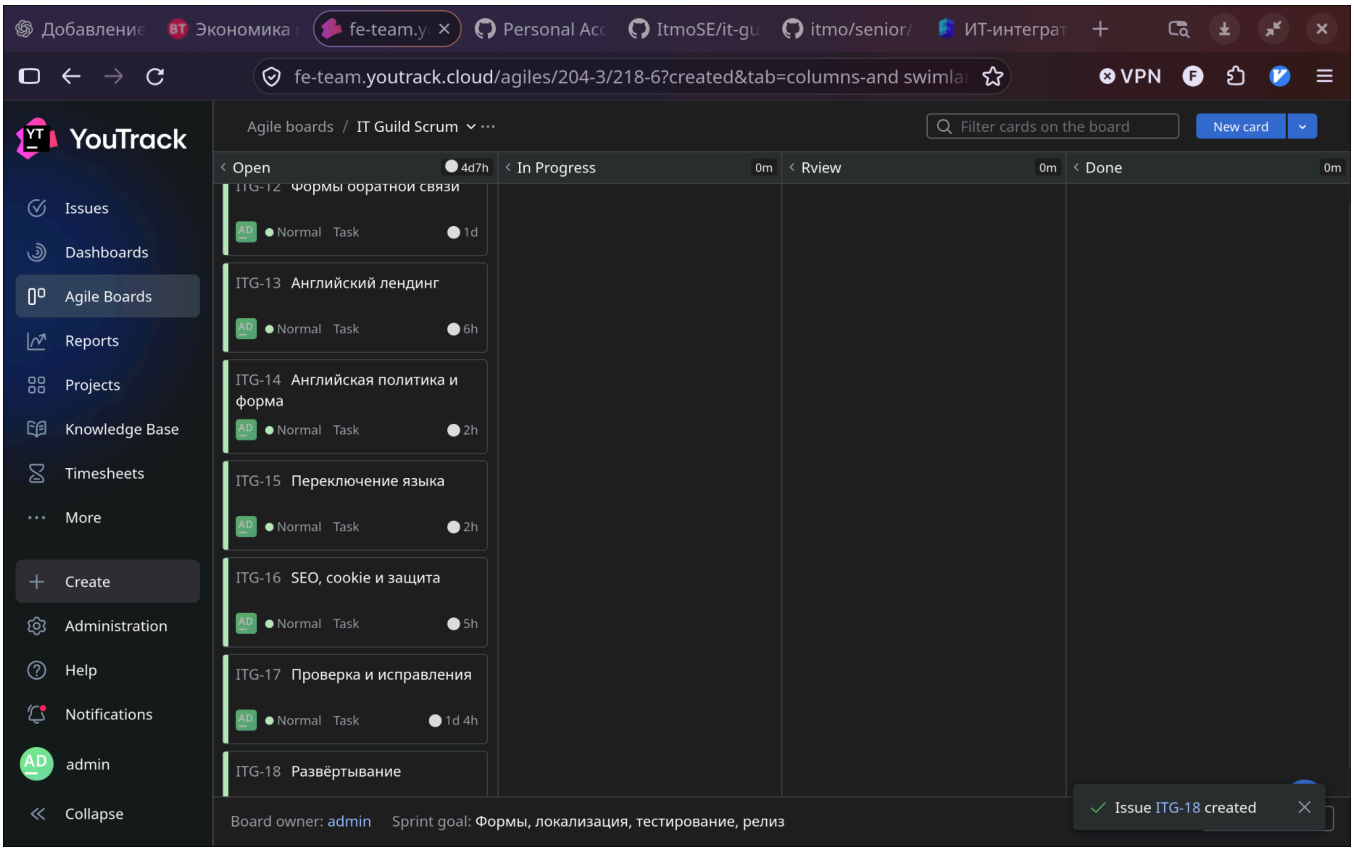


Рис. 8. Sprint 3: семь задач, оценка 39 ч.

2.3 Релиз

Добавлено пользовательское поле Fix version типа version; создана версия v1.0.0 с датой релиза 29.10.2026. Версия назначена задачам проекта массовой командой. Тестовая почтовая задача ITG-19 не входит в базовый план из 18 работ.

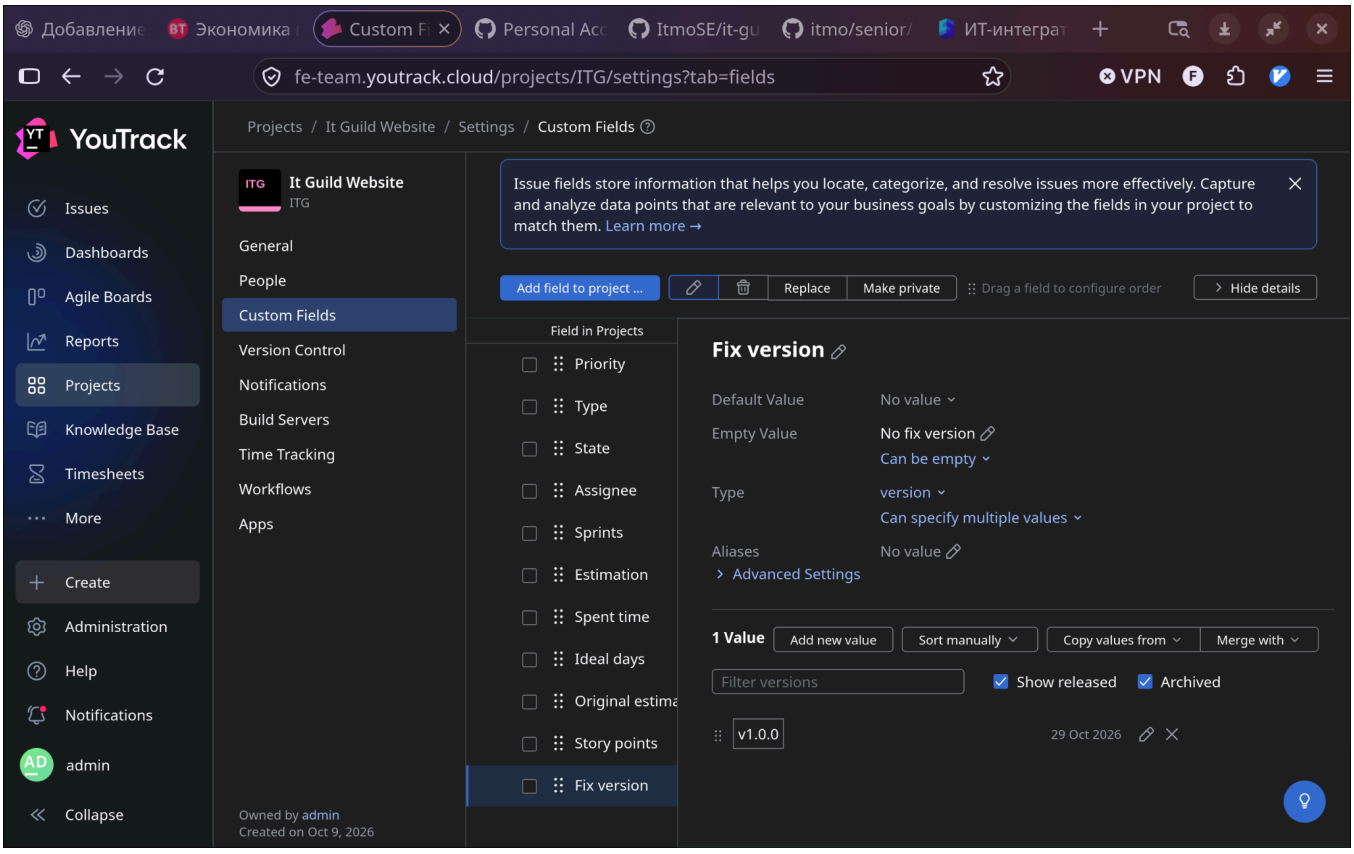


Рис. 9. Пользовательское поле Fix version и версия v1.0.0.

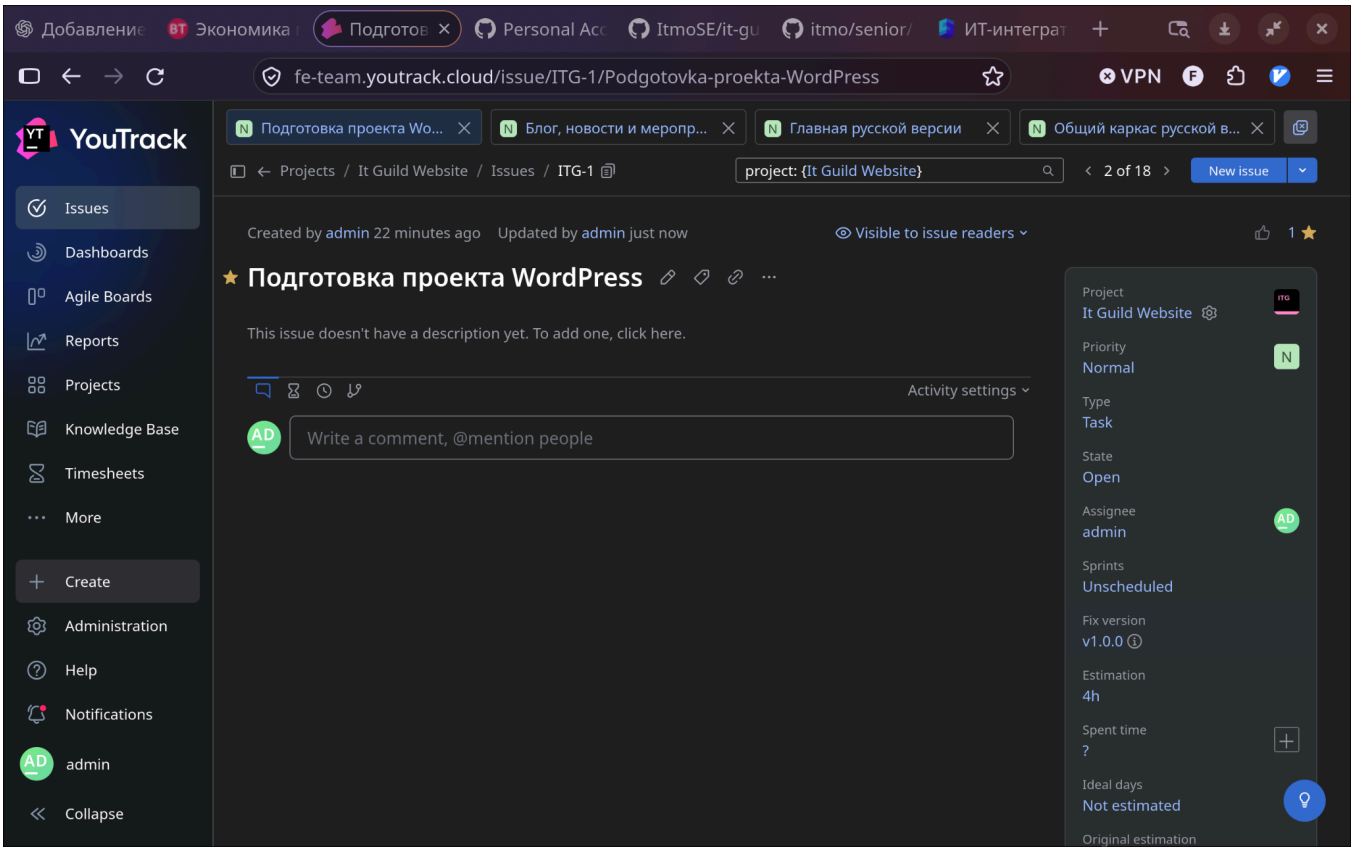


Рис. 10. Назначенная версия v1.0.0 на задаче ITG-1.

3 Интеграции

3.1 GitHub

Для проекта подключён репозиторий itmose/it-guild. В репозитории созданы ветки main, feature/sprint-1, feature/sprint-2, feature/sprint-3. Проверка: коммит 14949db4 с сообщением «ITG-1: initialize WordPress project» отображён в активности задачи ITG-1.

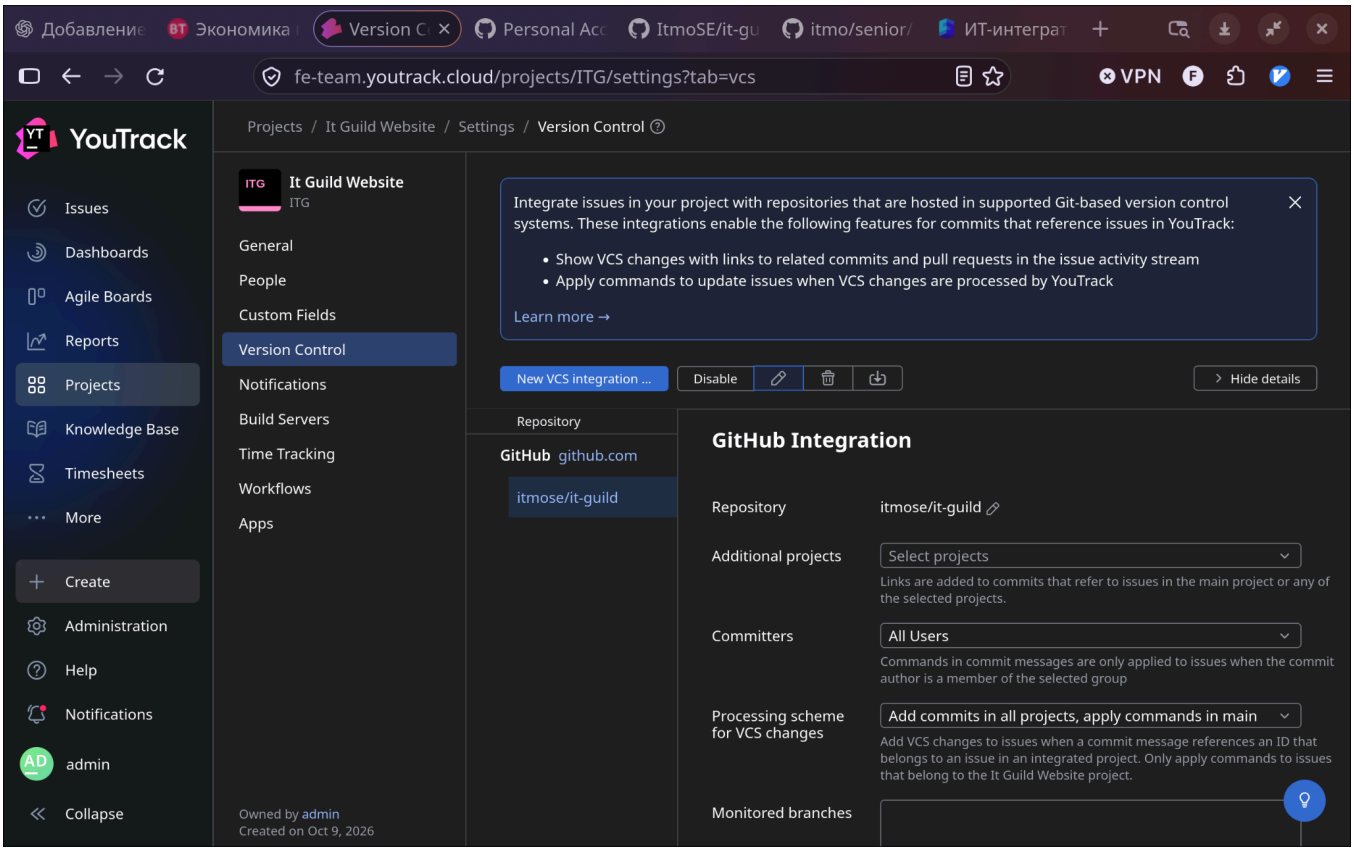


Рис. 11. Настройки VCS-интеграции с GitHub.

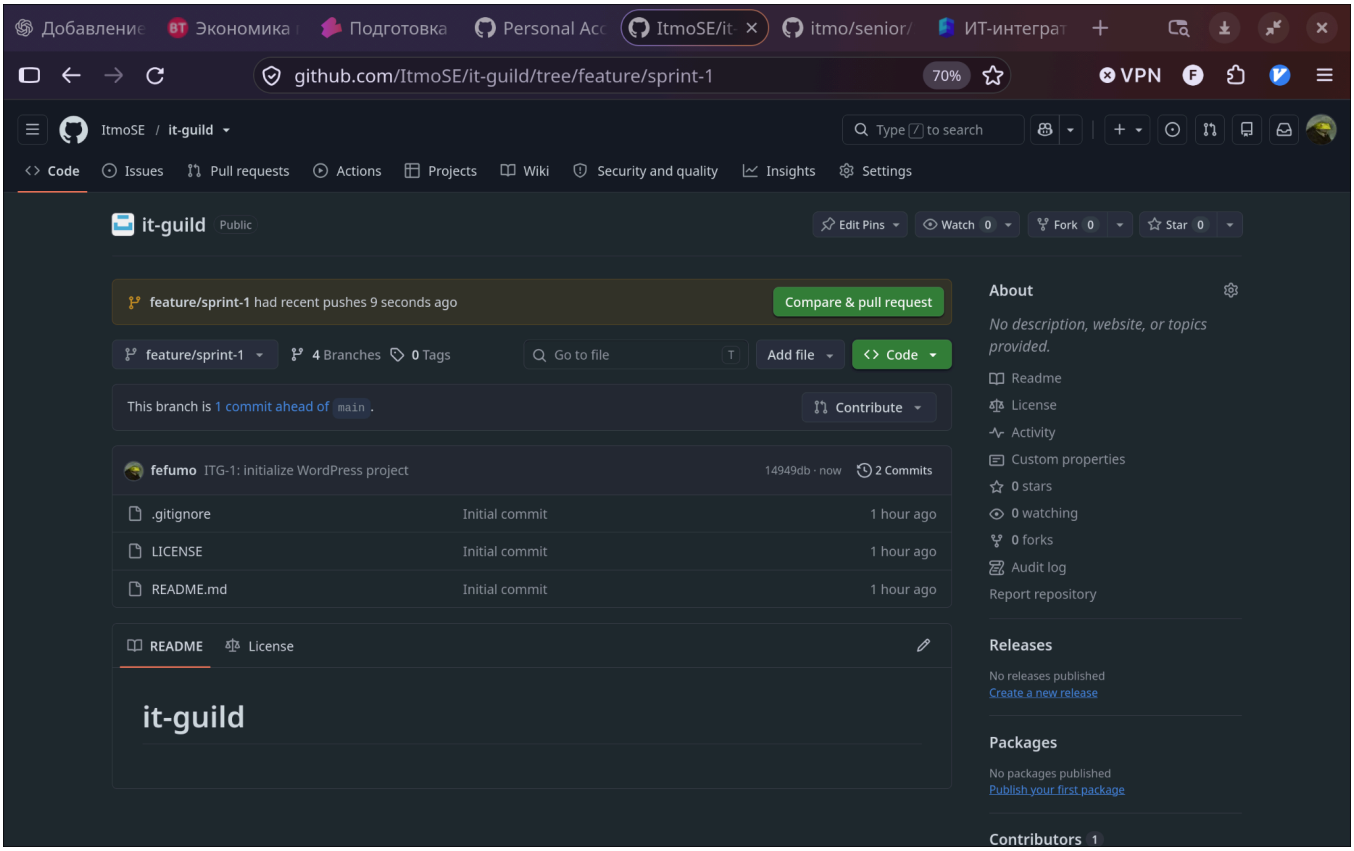


Рис. 12. Ветка feature/sprint-1 и тестовый коммит.

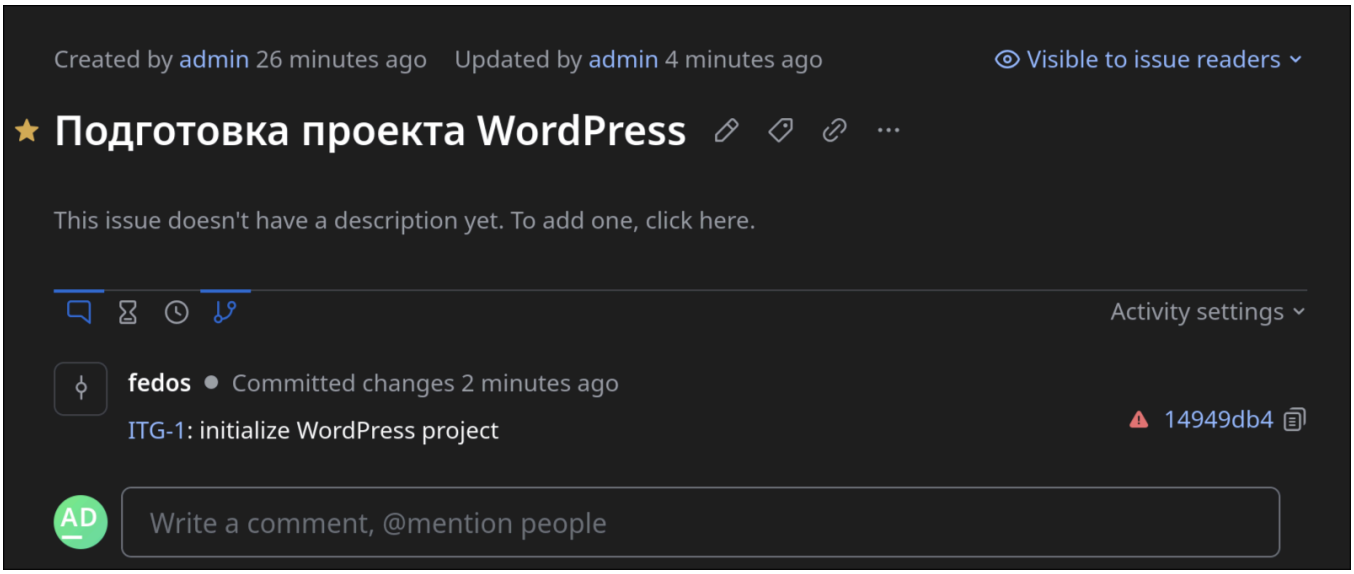


Рис. 13. Коммит GitHub в активности ITG-1.

3.2 Электронная почта

Создано правило Mailbox Integration для `fe-team@youtrack.cloud` с направлением писем в проект ITG. Интервал проверки — 2 минуты. Тестовое входящее письмо преобразовано в задачу ITG-19 «Тестовая заявка на демонстрацию продукта». Эта задача используется только для проверки интеграции.

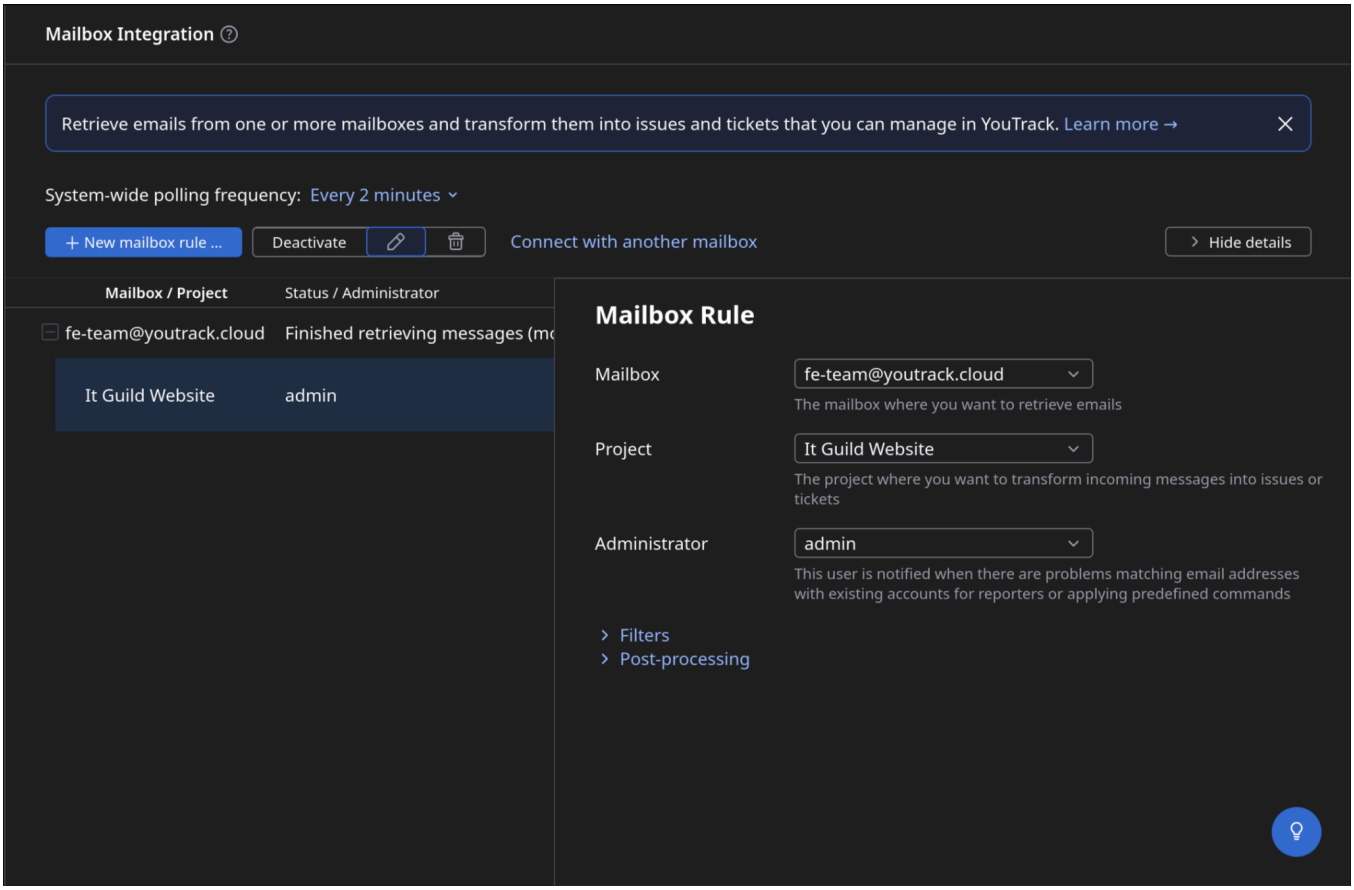


Рис. 14. Настроенное правило Mailbox Integration.

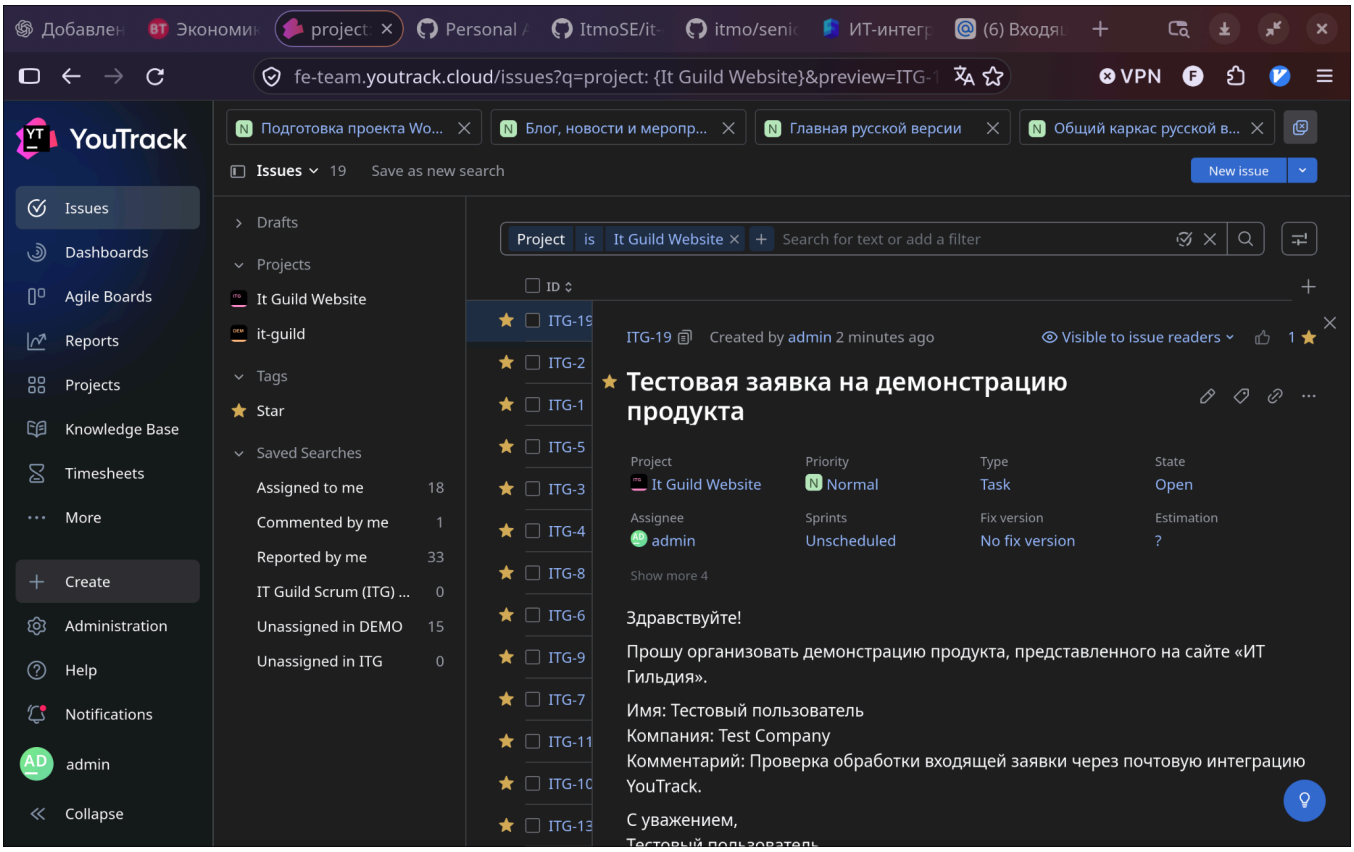


Рис. 15. Созданная из входящего письма задача ITG-19.

4 Симуляция выполнения

Симулировались переходы задач по workflow Open → In Progress → Review → Done. Время регистрировалось вручную как учебные модельные трудозатраты; реальные работы по реализации сайта этим не подтверждаются. Для Sprint 1 зафиксировано промежуточное распределение по четырём статусам, затем все пять задач переведены в Done.

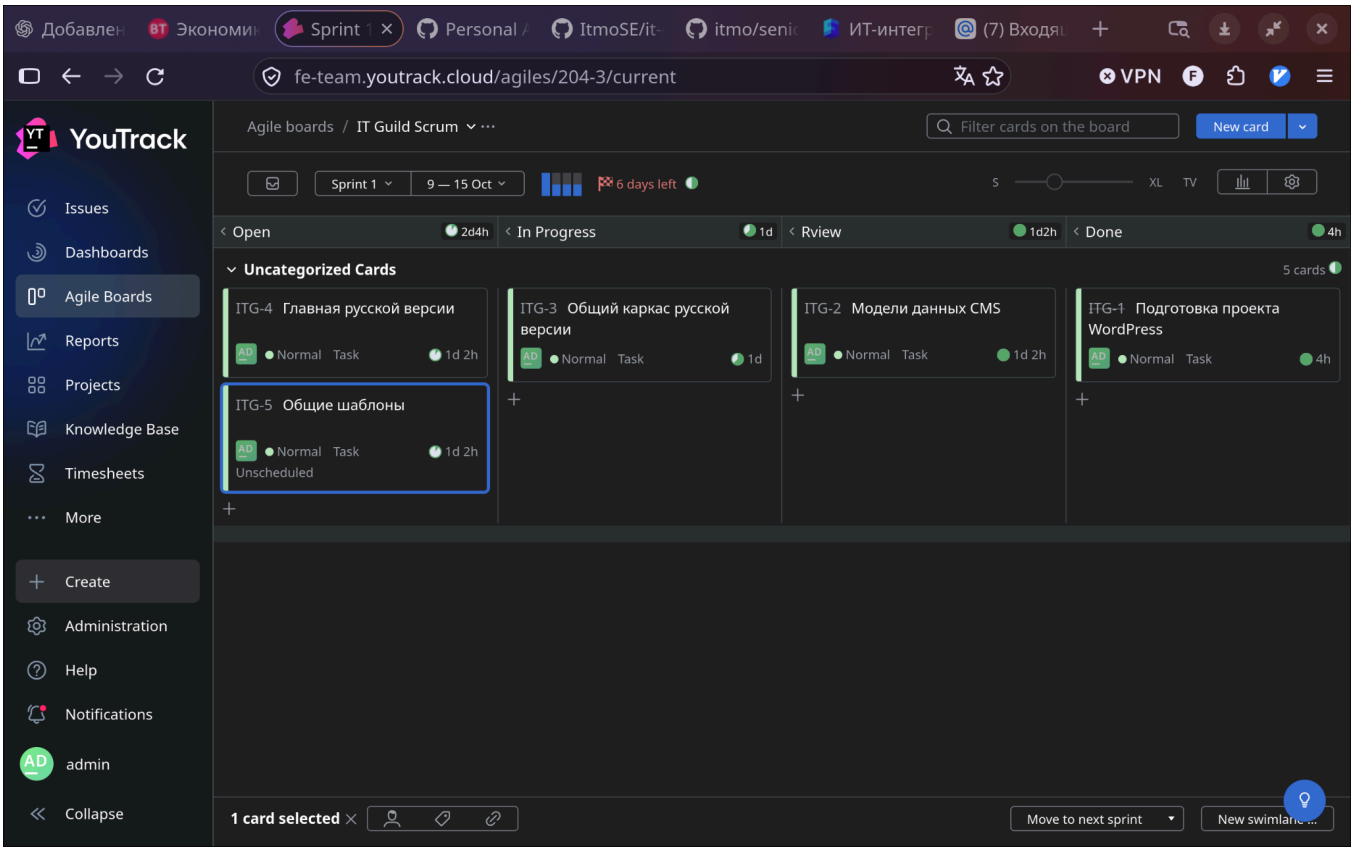


Рис. 16. Промежуточное распределение задач Sprint 1 по статусам.

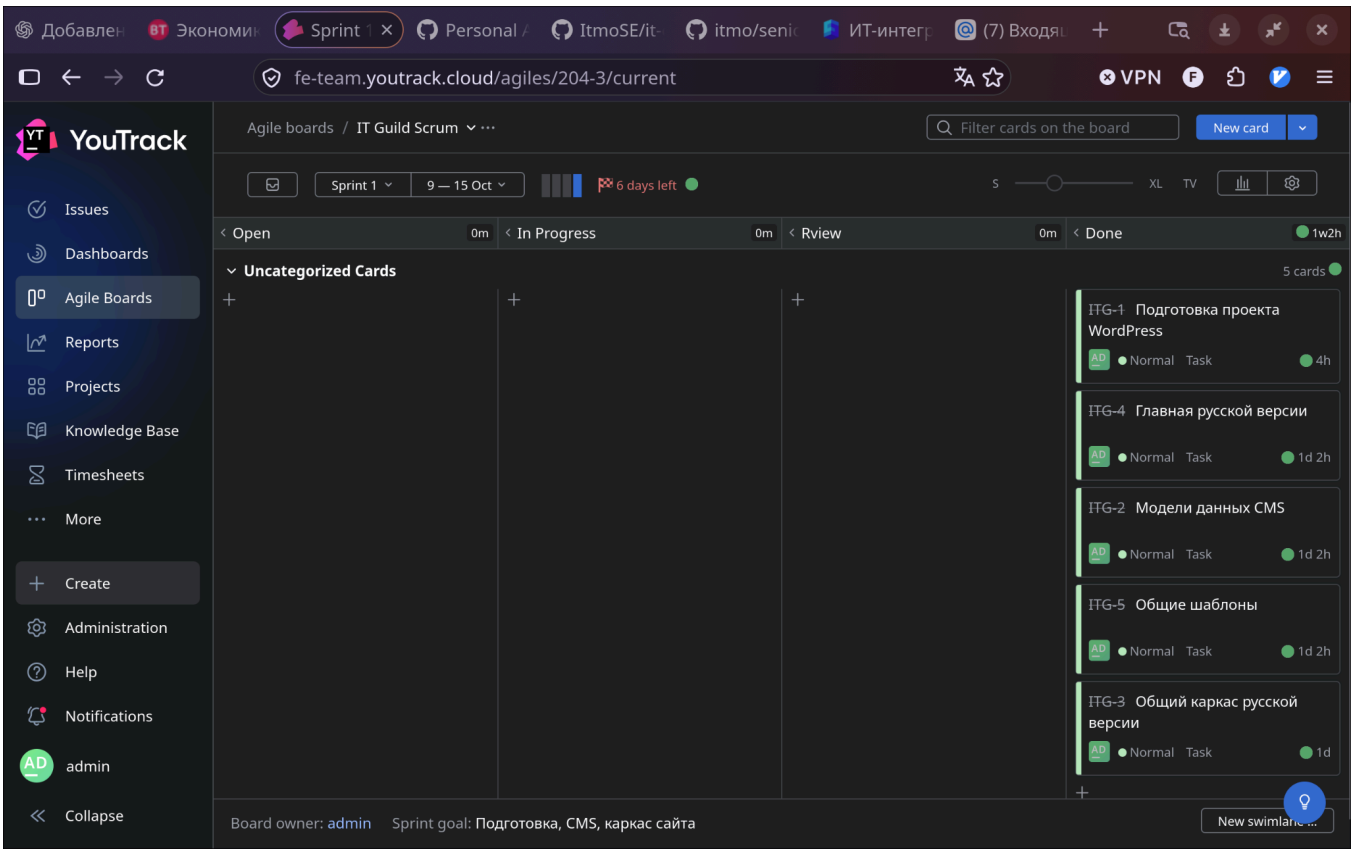


Рис. 17. Все пять задач Sprint 1 в состоянии Done.

5 Метрики YouTrack

5.1 Time Report

Для Sprint 1 сформирован отчёт по задачам: план 42 ч, зарегистрировано 42 ч. Суммы для ITG-1—ITG-5: 4, 10, 8, 10, 10 часов. Отчёт показывает модельный учёт, а не независимое подтверждение времени разработки.

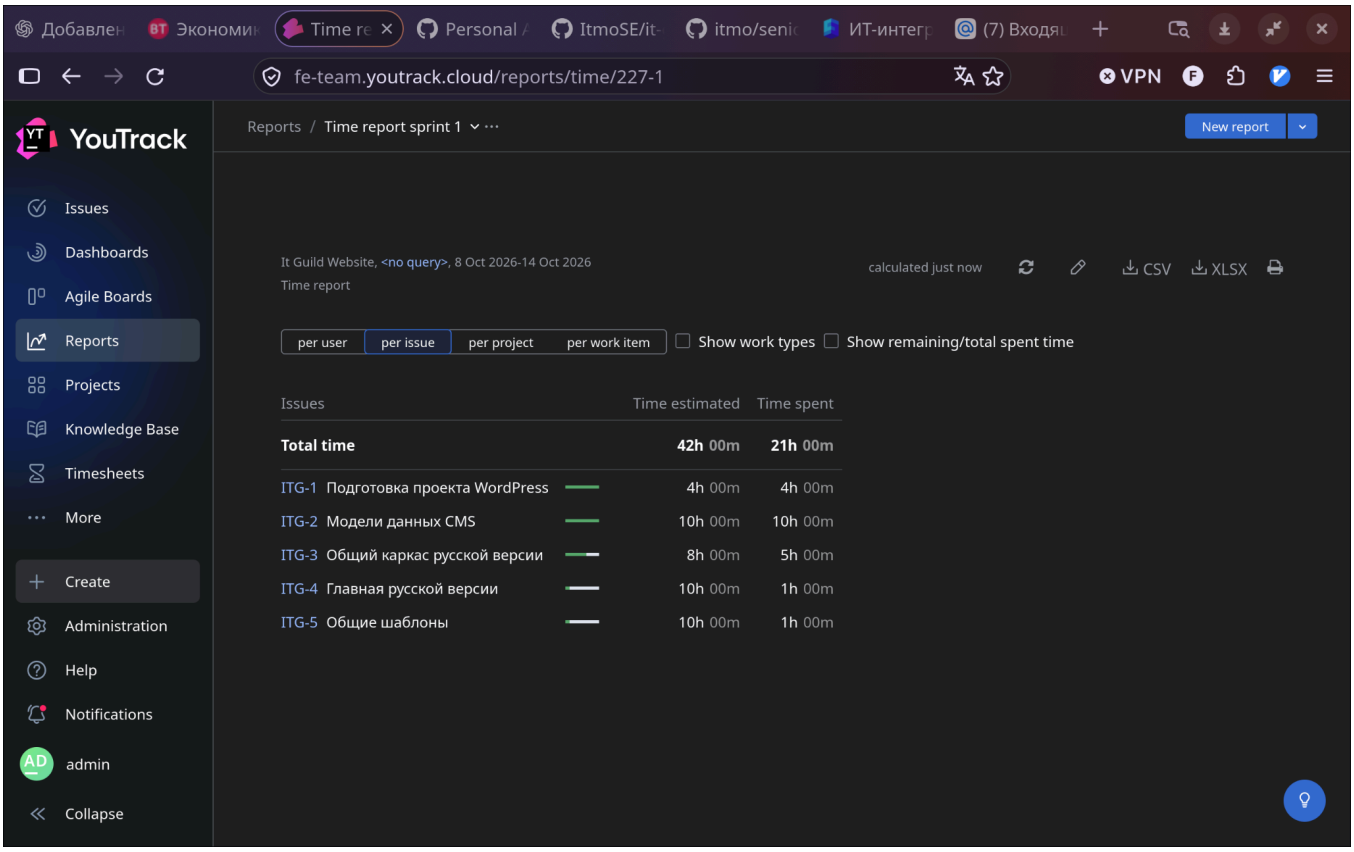


Рис. 18. Промежуточный Time Report: 21 ч из 42 ч.

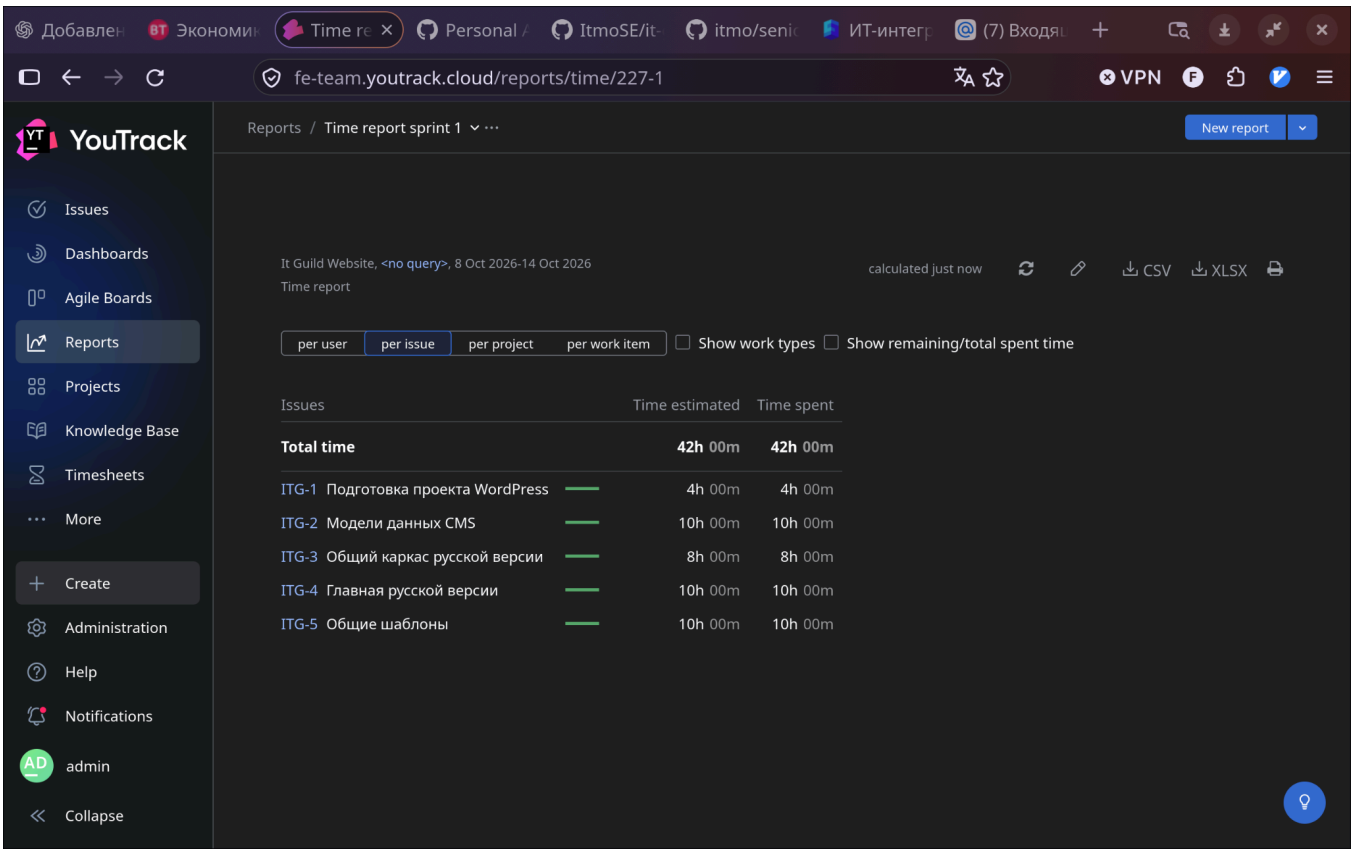


Рис. 19. Time Report Sprint 1: 42 ч из 42 ч.

5.2 Burndown

Приведён Burndown Report только для Sprint 1. Голубая линия обнуляется 9 октября, поскольку задачи были переведены в завершённое состояние в один день. Задним числом добавленные записи Spent time не восстанавливают историю смены статусов; поэтому диаграмма не имитирует реальное постепенное закрытие задач за всю неделю.



Рис. 20. Burndown Report Sprint 1 (учебная симуляция).

5.3 Gantt Chart

Сформирована диаграмма Ганта для задач проекта с датами 09–29.10.2026; отображаемая продолжительность — 2w 4d 6h. При отсутствии полных связей depends on автоматическое расписание не является доказательством фактической последовательности выполнения. Приведены плановое и фактическое представления диаграммы.

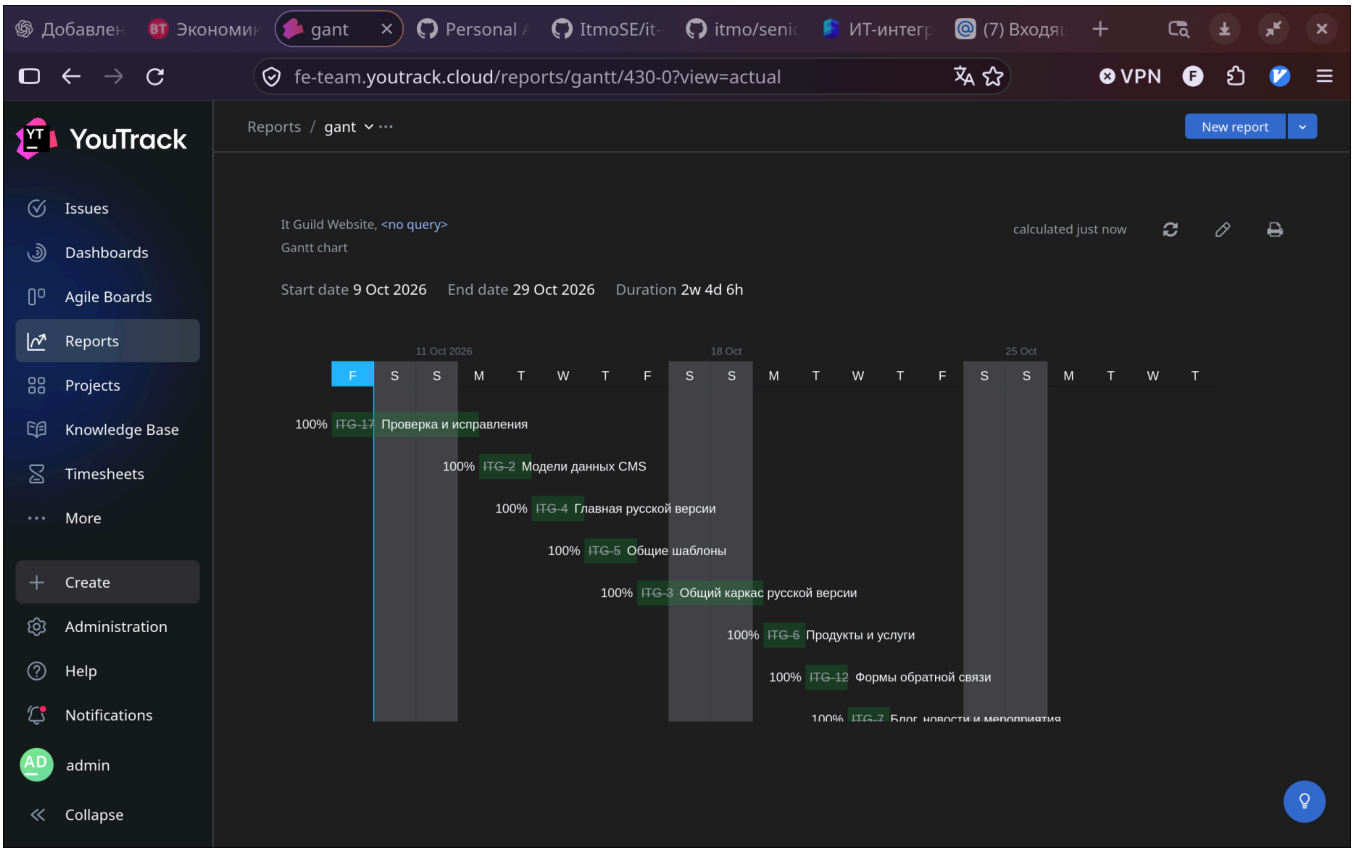


Рис. 21. Диаграмма Ганта — представление 1.

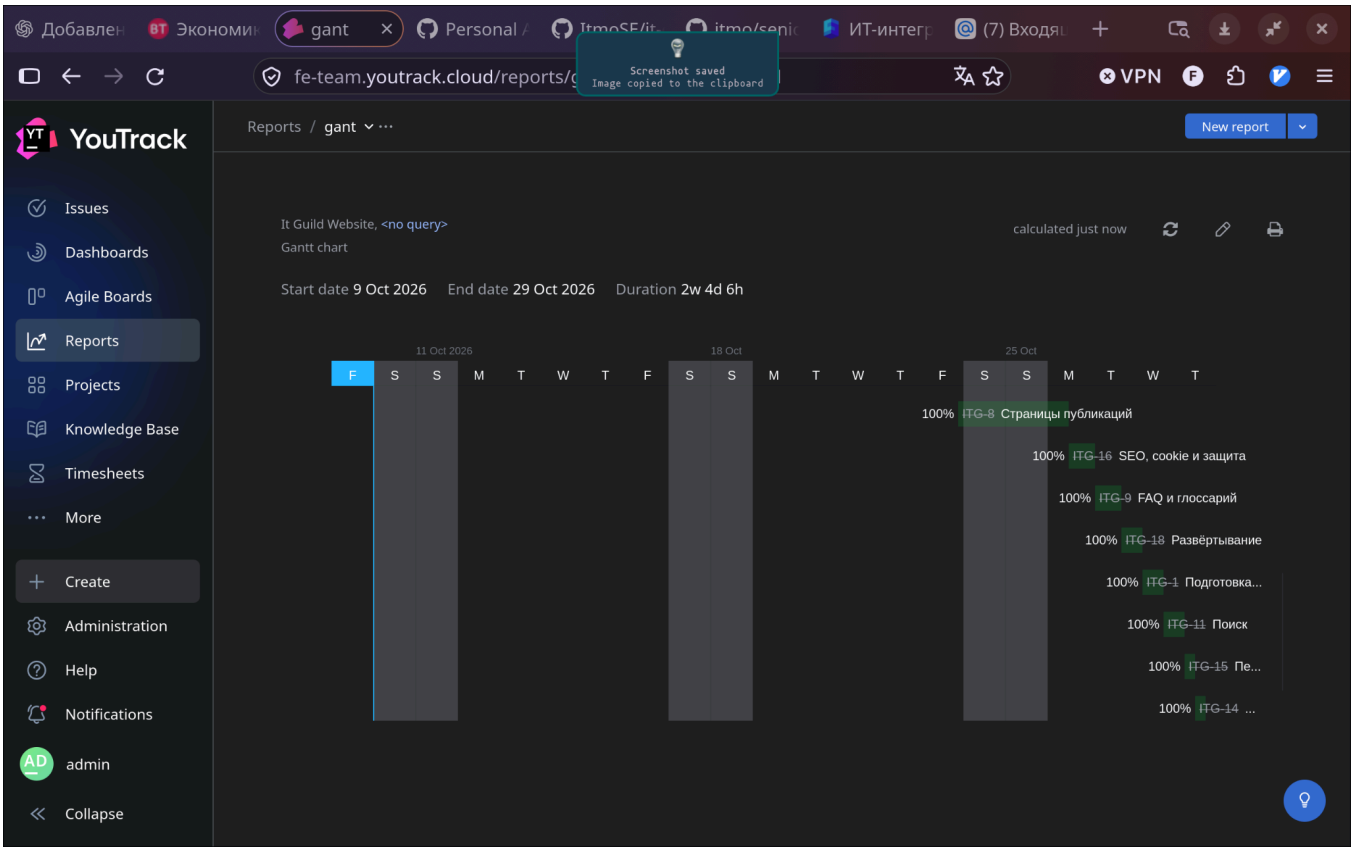


Рис. 22. Диаграмма Ганта — представление 2.

5.4 Ограничение комплекта отчётов

Отчёт Distribution Report по исполнителям не представлен по решению автора. В отчёте отражён состав команды, однако формально обязательный отчёт по исполнителям отсутствует. Тестовая задача ITG-19 исключена из описания проектных работ.

6 Вывод

Создан проект ITG в YouTrack Cloud, настроены Scrum-доска, workflow, три спринта, 18 задач, релиз v1.0.0, интеграции GitHub и электронной почты. Продемонстрированы изменение статусов и учёт модельного рабочего времени. Построены Time Report, Burndown Report Sprint 1 и диаграмма Ганта. Отчёт по исполнителям не приложен.
